

Paraguay

Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento (MDGF-1910)



Gobernanza Económica Democrática

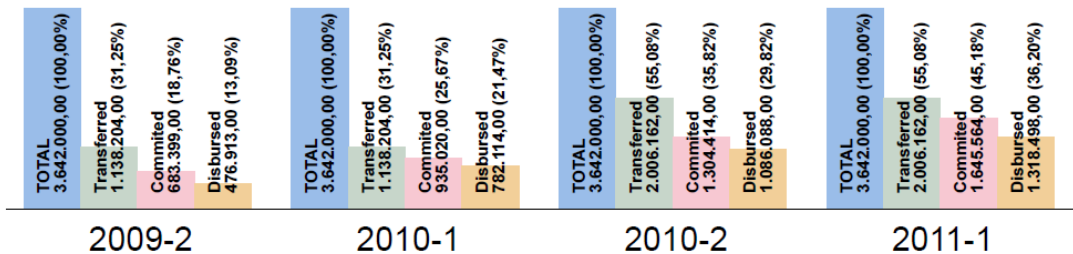
Presupuesto total:	USD 3,642,000		
Presupuesto por Agencia:	UNDP:1,514,510 UNICEF:981,623	PAHO:590,105 ILO:555,762	
Entidades gubernamentales participantes:	Secretaría Técnica de Planificación (STP), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), Secretaría del Ambiente (SEAM), Ministerio del Interior, Gobernación de Boquerón, Gobernación de Caazapá.		
Fecha de inicio:	Febrero 24, 2009		
Fecha de fin:	Febrero 24, 2012		
Extensión:	Diciembre 31, 2012		
Desembolsos:	Primer Desembolso:	Febrero 11, 2009	USD1,138,203
	Segundo Desembolso:	Junio 18, 2010	USD1,642,967
	Tercer Desembolso:	Agosto 26, 2011	USD 1,635,838
Resumen:	El programa promoverá un aumento sostenible del acceso al agua potable y saneamiento en Paraguay con servicios de calidad, con énfasis en comunidades rurales dispersas y poblaciones indígenas, para disminuir la brecha existente, mediante i) capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas; ii) fortalecimiento de la ciudadanía para ejercer sus derechos y participar activamente en la planificación y el control de las acciones del sector público; iii) desarrollo de modelos de financiamiento de la infraestructura de agua y saneamiento a través de instrumentos financieros locales que apunten a la sostenibilidad de los sistemas; y iv) el acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.		

Resultados esperados:

1. Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.
2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados.
4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.



Regiones de Intervención:	Comunidades rurales dispersas e indígenas de los Departamentos de Caazapá (municipios de Abai y Moises Bertoni) y Boquerón (municipios de Filadelfia y Mariscal Estigarribia).
ODM	MDG7 :T7C. La encuesta especializada de agua potable y saneamiento arroja cifras e informaciones sobre la

cobertura del servicio a nivel país, en tanto el Estudio Rápido de la Calidad del Agua (ERCA) informa sobre la calidad del servicio de agua. Ambos análisis fueron concluidos y han servido de insumo para el cálculo de las necesidades presupuestarias para alcanzar el ODM 7c referente la población con acceso a agua potable y saneamiento. El informe de alcance de los ODMs realizado por primera vez por el gobierno saldrá publicado a finales de 2011.																											
Coordinador/a del Programa: Ricardo Yorg Ricardo.yorg@undp.org OCR: Sonia Tato sonia.tato@one.un.org																											
Beneficiarios a la fecha:	Directos	Indirectos																									
- No. Instituciones - No. Mujeres - No. Hombres - No. Grupos étnicos	Generado por el sistema																										
Estado:	En fase final de implementación.																										
Estado de ejecución financiera según informe semestral de julio 2011:	 <table><thead><tr><th>Año</th><th>TOTAL</th><th>Transferred</th><th>Committed</th><th>Disbursed</th></tr></thead><tbody><tr><td>2009-2</td><td>3.642.000,00 (100,00%)</td><td>1.138.204,00 (31,25%)</td><td>683.399,00 (18,76%)</td><td>476.913,00 (13,09%)</td></tr><tr><td>2010-1</td><td>3.642.000,00 (100,00%)</td><td>1.138.204,00 (31,25%)</td><td>935.020,00 (25,67%)</td><td>782.114,00 (21,47%)</td></tr><tr><td>2010-2</td><td>3.642.000,00 (100,00%)</td><td>2.006.162,00 (55,08%)</td><td>1.304.414,00 (35,82%)</td><td>1.086.088,00 (29,82%)</td></tr><tr><td>2011-1</td><td>3.642.000,00 (100,00%)</td><td>2.006.162,00 (55,08%)</td><td>1.645.564,00 (45,18%)</td><td>1.318.496,00 (36,20%)</td></tr></tbody></table>		Año	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed	2009-2	3.642.000,00 (100,00%)	1.138.204,00 (31,25%)	683.399,00 (18,76%)	476.913,00 (13,09%)	2010-1	3.642.000,00 (100,00%)	1.138.204,00 (31,25%)	935.020,00 (25,67%)	782.114,00 (21,47%)	2010-2	3.642.000,00 (100,00%)	2.006.162,00 (55,08%)	1.304.414,00 (35,82%)	1.086.088,00 (29,82%)	2011-1	3.642.000,00 (100,00%)	2.006.162,00 (55,08%)	1.645.564,00 (45,18%)	1.318.496,00 (36,20%)
Año	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed																							
2009-2	3.642.000,00 (100,00%)	1.138.204,00 (31,25%)	683.399,00 (18,76%)	476.913,00 (13,09%)																							
2010-1	3.642.000,00 (100,00%)	1.138.204,00 (31,25%)	935.020,00 (25,67%)	782.114,00 (21,47%)																							
2010-2	3.642.000,00 (100,00%)	2.006.162,00 (55,08%)	1.304.414,00 (35,82%)	1.086.088,00 (29,82%)																							
2011-1	3.642.000,00 (100,00%)	2.006.162,00 (55,08%)	1.645.564,00 (45,18%)	1.318.496,00 (36,20%)																							
Principales logros: (por resultado)	Resultado 1: Evaluación rápida de calidad del agua a nivel nacional realizada, cuestionario único de encuesta nacional de agua y saneamiento, sistema informático del inventario nacional de recursos hídricos instalado, actualización del análisis del sector agua y saneamiento, plan de capacitación de técnicos de SENSA y juntas de saneamiento completado. Resultado 2: Aplicación de encuestas, grupos focales y analizadas. la Encuesta Indígena y la Encuesta nacional de Agua, sistematización de las tecnologías y modelos utilizados hasta la fecha. Resultado 3: Modelo financiero publico/privado para gobiernos departamentales y municipios diseñado. Resultado 4: Actividades preparatorias.																										
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo): En el año 3 se ha ajustado el enfoque de género y de interculturalidad de los productos para garantizar estos enfoques transversales. Algunas acciones que incorporan el enfoque de género son: manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento, incorporación de temas y promoción de la participación de las mujeres en los talleres y eventos del PC, incorporación de perspectiva en la encuesta especializada sobre agua y saneamiento.																											
Observaciones																											
Declaración de Paris	Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: Secretaría Técnica de Planificación (STP) lidera el CGP y también representa al gobierno en el CDN. En la última reunión del mismo se solicita que las reuniones sean bimensuales y se refuerza la necesidad de una mayor participación y apropiación institucional. En la reunión de septiembre se decidirá el calendario de reuniones del CDN. El programa tiene previsto contratar un especialista en agua potable y saneamiento para fortalecer la función de enlace entre la STP y los demás actores institucionales. El involucramiento de las																										

	municipalidades y departamentos debería ser enfatizado a lo largo del PC. Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: Se está promoviendo la participación e involucramiento de las comunidades beneficiarias (metodología PIAR). También se prevé que en el diseño de las obras, las posibilidades tecnológicas sean sometidas a un proceso de consulta para garantizar que sean socialmente adecuadas y aceptadas. Este aspecto debe ser monitoreado ya que el resultado 2 y 4 (que implican mayores niveles de participación) se encuentran en su etapa de implementación, de acuerdo al cronograma previsto. Armonización y alineamiento: El PC está alineado y contribuye al desarrollo de políticas públicas en materia de agua y saneamiento. Elementos innovadores en rendición de cuentas: No se mencionan
Unidos en la Acción	Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión: No se mencionan Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: La OCR realiza un efectivo control de calidad de los documentos enviados y apoya de manera sistemática al equipo. Además facilita la interlocución con el Secretariado. Ambos PCs en el país han comenzado, en la fase final de implementación, a desarrollar planes de comunicación y a mejorar sus sistemas de seguimiento, pero se debería asegurar un mayor nivel de intercambio entre ambos programas en estos dos temas a la par que se definen algunas iniciativas conjuntas (algún producto comunicacional o una capacitación en S&E). Coordinación interagencial: No se reseñan dificultades en el informe semestral. En respuesta a las recomendaciones del la MTE se ha contratado un punto focal de PNUD para reforzar las actividades de ejecución y coordinación de la agencia líder PNUD.
Sostenibilidad (acciones concretas y estrategias de asociación)	Plan de sostenibilidad: si (en proceso) La Estrategia de sostenibilidad y el Plan de mejora fueron elaborados y aprobados en forma consensuada por todos los miembros del CGP, si bien muchas de las acciones se refieren a la continuidad del PC y no tanto al financiamiento del PC cuando éste haya terminado. El equipo confirma que existe un compromiso en firme de la gobernación y de SENASA de financiar los sistemas de agua y saneamiento que no puedan ser financiados por el PC. La movilización de recursos adicionales está contemplada en las propuestas del modelo financiero a ser implementado durante las obras; como refuerzo se darán capacitaciones sobre "Captación de recursos para proyectos de agua y saneamiento" dirigido a los funcionarios públicos de los gobiernos locales.
Escalabilidad e innovación	Se busca que los sistemas de agua y saneamiento a ser implementados se constituyan en modelos que puedan ser replicables en otras comunidades.
Factores externos/ acciones de mitigación	Ante la posible saturación de las poblaciones participantes por el elevado número de talleres, éstos se han agrupado y reducido. En el año 4 el PC debe consolidar su estrategia de acompañamiento local ya que la MTE percibe que hasta la fecha la acción en los departamentos seleccionados ha sido eminentemente a través de talleres puntuales. Se considera que el hecho de que la instancia de dialogo del sector haya surgido del CGP del PC ayudará a que, en caso de que la propuesta de reforma del sector sea aprobada, los cambios se den de forma consensuada y/o coordinada entre las distintas instituciones.
Comunicación e incidencia	Plan C&I: si/no El PC de GE es muy concreto en la identificación del objetivo y metas a los que la intervención puede contribuir (acceso a agua potable y acceso a servicios de saneamiento) y su valor añadido reside en el hecho de que el PC esté impulsando la desagregación entre acceso de la población urbana, rural e indígena. Esto se ve reforzado por algunas actividades impulsadas por el PC, como la asistencia en la encuesta nacional de agua que distingue entre hogares de la población general y la encuesta comunitaria indígena.

Seguimiento y Evaluación	En mayo 2011 se lleva a cabo una revisión del sistema de seguimiento. Actualmente se cuenta con una experta en monitoreo que trabajará con el equipo hasta la finalización del Programa. El marco es ahora una herramienta sencilla que permite ver el avance por actividad y producto El marco tiene una introducción en la que se explican las líneas básicas del sistema. Se convocará l al CGP a una capacitación sobre las herramientas de seguimiento.								
Misiones de seguimiento del Secretariado:	<table> <tr> <td>Fechas: Noviembre, 2009</td><td>Miembro/s: JAG/ PFP</td></tr> <tr> <td>Junio, 2010</td><td>PFP</td></tr> <tr> <td>Mayo, 2011</td><td>PFP</td></tr> <tr> <td>Mayo, 2011</td><td>JAG</td></tr> </table>	Fechas: Noviembre, 2009	Miembro/s: JAG/ PFP	Junio, 2010	PFP	Mayo, 2011	PFP	Mayo, 2011	JAG
Fechas: Noviembre, 2009	Miembro/s: JAG/ PFP								
Junio, 2010	PFP								
Mayo, 2011	PFP								
Mayo, 2011	JAG								
Evaluación de medio término:	Evaluador/a: Oscar Huertas Periodo: noviembre-diciembre 2010 Informe de evaluación/plan de mejora: link								
